

# 三陸沿岸道路 (仮称) 気仙沼湾横断橋 小々汐だより

平成27年12月発行  
第3号

ご関係の皆様には大変お世話になっております。  
工事の現況などについてお知らせいたします。  
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

発行元：鹿島・東亜特定建設工事共同企業体  
気仙沼湾横断橋小々汐JV工事事務所  
TEL:0226-25-5661 FAX:0226-24-3341



現場見学をご希望の方は上記連絡先までご連絡下さい。(担当:小室)


## 工事現況

### 鋼管矢板を打設しています。

9月から引き続き、杭基礎及び橋脚施工の際の遮水壁となる鋼管矢板の打設を行っています。全91本のうち隔壁部の15本の打設を完了し、現在は外周部の下杭の施工を行っています。この作業は来年の春頃まで続く予定です。



施工状況 (12月7日撮影)

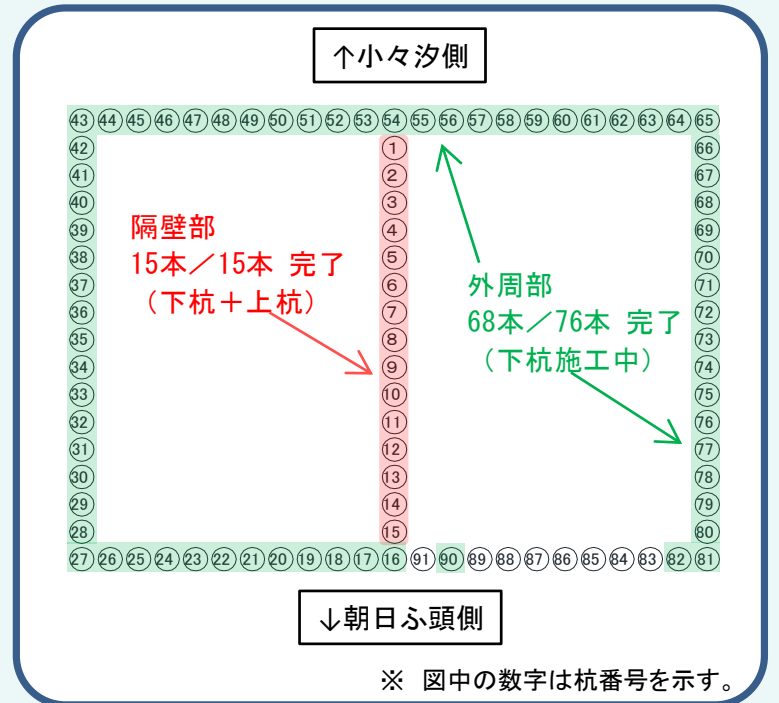

※ 図中の数字は杭番号を示す。  
<鋼管矢板打設状況 進捗図>  
(12/16現在)

## 安心して下さい! はいってますよ 支持層に

上記の鋼管矢板は、(仮称) 気仙沼湾横断橋全体の荷重を支える基礎構造物の杭基礎として大きな役目を担っていますので、この鋼管矢板が「支持層」と呼ばれる固い岩盤に入っているかどうかの確認はとても重要になります。  
当工事では、調査ボーリング時に採取した支持層の試料と実際の鋼管矢板の施工時に採取した試料を発注者様立会いの下で見比べることにより、確認を実施しています。



採取試料の確認状況

## トピック

### イルミネーション点灯式・現場見学会を開催!

12月5日(土)、近隣の小・中学生等を現場に招いて、SEP台船上に設置したイルミネーションの点灯式と現場見学会を開催しました。  
当日は風の強い中、また「ONE-LINE 気仙沼 2015」の点灯式の直前という時間帯にも関わらず、保護者の方々を含め13名の皆様にご参加いただき、気仙沼湾横断橋完成への期待と激励のお言葉を頂きましたことに深く御礼を申し上げます。  
今後も現場見学会を開催予定ですので是非ご参加下さい。  
(見学会のご希望については事務所までご連絡下さい!)

※ クリスマスイルミネーションについて  
期間：平成27年12月5日～平成27年12月25日  
時間：日没後～22：00頃まで ※荒天時および休工日は点灯しません。



参加者全員で記念撮影



風が吹くとサンタが手を振っているように見えます。

## 工事の予定

月 日	平成27年 12月												平成28年 1月																													
	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
作業内容																																										
鋼管矢板打設工 (昼夜作業)																																										
下杭打設	外周部												年末年始休暇												外周部																	
現場円周溶接、上杭打設	外周部準備																								外周部																	
鋼管内掘削土揚土																									第8船																	
鋼管矢板搬入 (鹿島港～気仙沼港)	第7船																								第8船																	
備考																																										

## 工事情報 発信中!

『海の市』2Fに設置した「気仙沼湾横断橋」と「大島架橋」の広報スペースでは、工事状況をお知らせするパネルを毎月更新しています。海の市にお越しの際は是非お立ち寄り下さい。



今年も残すところわずかとなりました。  
当工事事務所は12月27日(日)～から1月5日(火)まで休業致します。
