三陸沿岸道路
(仮称)気仙沼湾横断橋

小々汐だより

平成28年10月発行
第8号

ご関係の皆様には大変お世話になっております。
工事の現況などについてお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

発行元：鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
気仙沼湾横断橋小々汐JV工事事務所
TEL：0226-25-5661　FAX：0226-24-3341
※現場見学をご希望の方は上記連絡先までご連絡下さい（担当：小室）

工事現況

井筒内の水を抜く準備をしています

9月26日に鋼管矢板で締め切られた井筒内の海底土を水中で掘削する作業が完了しました。（掘削土量は約20,000㎥）現在は井筒内の水を抜き、橋脚を構築する準備をしております。

10月3日に掘削した海底面の高さを均一にするための砕石を敷き終え、10月１３日より井筒内の水を抜いた時の掘削底面を安定させるため盤ぶくれ対策を行っております。

今後は、11月にコンクリートミキサー船が工事区域に入港して約2,000㎥のコンクリートを打設し、水を抜いたときに外側の水と土からかかる圧力に鋼管矢板が耐えられるように、支保工を設置していきます。

これからも海上での工事が続きますので、航行船舶の安全確保と海の環境保全を最優先に作業して参ります。

敷砂投入状況（平成28年9月27日撮影）

コラム

コンクリートミキサー船再び！！

井筒内の海底土を掘削した後には、海底面に水中でコンクリート（底盤コンクリート）を打設していきます。打設するコンクリートは水中不分離性（水中でも材料がばらけることのない優れものです）のものを使用します。小々汐だより第6号でご紹介した、高さ30mのコンクリートミキサー船が再入港して打設しますので、現場付近へお立ち寄りの際は是非ご覧になってくださいね！

トピック

女性目線で現場を巡視！～たんぽぽパトロール～

10月5日（水）に現場で働くすべての人が働きやすい環境を目指し、女性目線で現場をチェックする『たんぽぽパトロール』を実施致しました。

現場だけでなく、宿舎・事務所を巡視してもらい、どうすれば働きやすい職場になるか指導してもらいました！

工事の予定

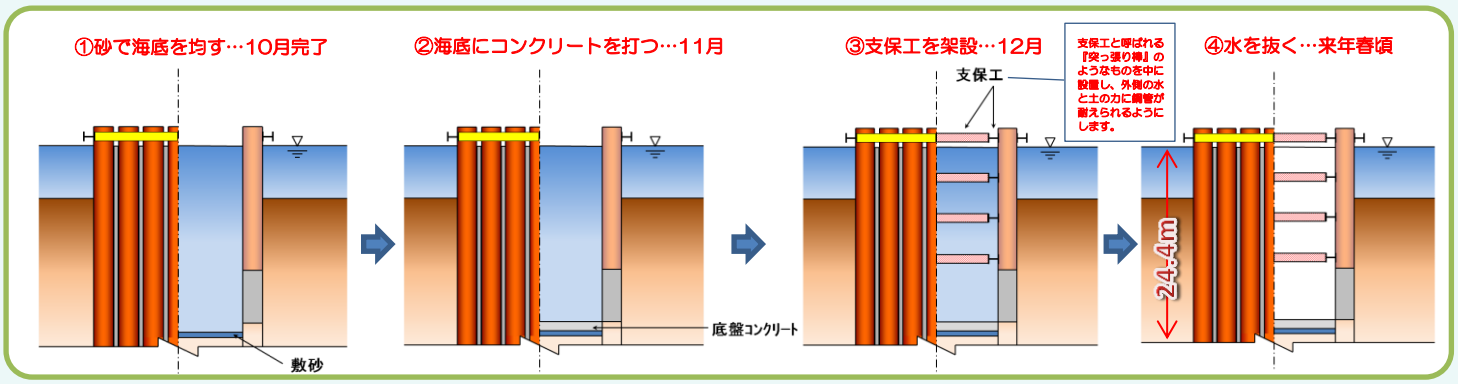

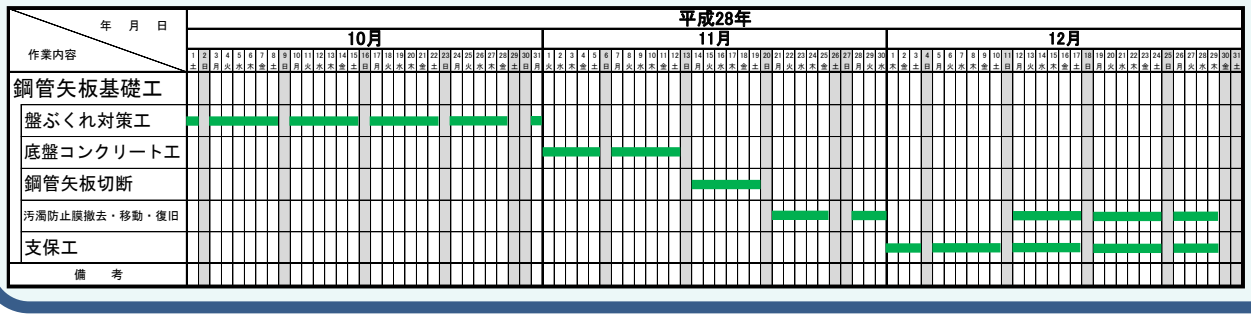

現場HP更新！

クールでおもしろい仕事
おもしろ物語@工事現場
