三陸沿岸道路
(仮称)気仙沼湾横断橋

小々汐だより

平成29年4月発行
第１１号

ご関係の皆様には大変お世話になっております。
工事の現況などについてお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

発行元：鹿島・東亜特定建設工事共同企業体
気仙沼湾横断橋小々汐JV工事事務所
TEL：0226-25-5661　FAX：0226-24-3341

※現場見学をご希望の方は上記連絡先までご連絡下さい（担当：小室）

工事現況

井筒内の水を抜き終わりました

P12橋脚部では2017年4月1日に鋼管矢板で囲われた井筒内部の水を抜き終わり、気仙沼湾に縦30m・横40m・深さ25mの大空間が出現しました（井筒内のドライアップ完了！）。今後は、橋脚本体の鉄筋を組み立てる作業が始まり、P12橋脚の構築作業に入ります。これまでは下へ下へと向かっていた作業が遂に上方向への作業に移ることになります。また、A2橋台部では予定地の伐採が完了し、工事用の仮設道路をつくる作業に着手しています。

海上での工事が続きますので、航行船舶の安全確保と海の環境保全を最優先に作業して参ります。また、陸上作業においても安全最優先で作業いたしますので引き続き、ご理解ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

工事全景（ドローン撮影）

P12橋脚（上空から望む）

P12橋脚（井筒内部から）

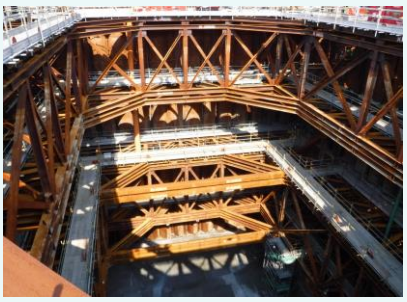
P12橋脚（井筒上部から）

トピック

現場見学会を実施しました！

2017年4月2日（日）に、工事現場近隣にお住まいの方々を対象に、現場見学会を開催いたしました。直前の御案内だったにもかかわらず、約７０名もの方々にご参加頂きました。工事現場を見ることが初めての方がほとんどで、船で現場へ移動してP１２橋脚部から海中に広がる大空間をみると思わず「おーっ」という声を上げる方もいらっしゃいました。

また、見学会の後には工事で使用するコンクリートブロックに「未来の気仙沼への想い」や「工事への応援メッセージ」を書いていただきました。

気仙沼湾横断橋への期待の大きさを感じるとともに、ご参加頂いた皆様より激励のお言葉を頂戴致しましたことを、この場をお借りして御礼申し上げます。今後も折を見て現場見学会を実施する予定ですので、ご希望の方は上記担当までお気軽にご連絡ください。

見学会の様子

船で現場まで移動します

現場で工事概要を説明

井筒の中も見学



素敵なメッセージを頂きました

工事予定

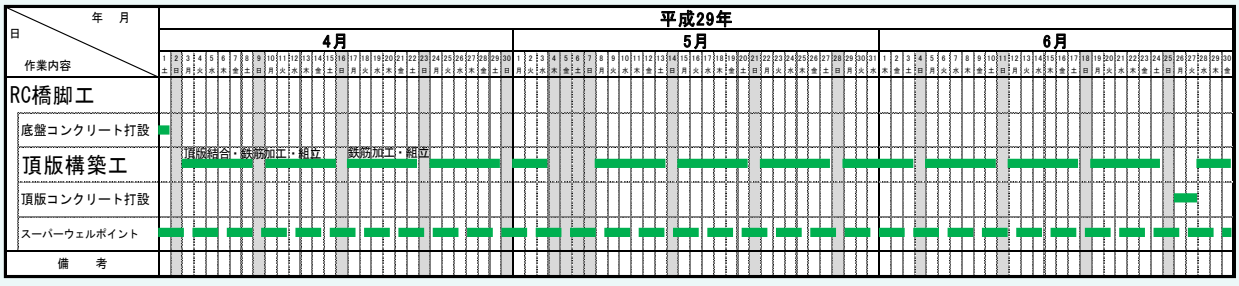

現場HP更新！

クールでおもしろい仕事
おもしろ物語@工事現場
